

Foto's realisatie toilet groep 1



TOILET GROEP 1

Kosten :

3 voetstap toiletten

Afvoer : septic tank

Bouwaanvraag nrs 7.000

1700 bakstenen nrs. 17.000

110 kilo betonijzer nrs. 7.150

3 x deurkozijn + deur nrs. 18.000

3 x raamkozijn nrs. 3.000

28 zakken cement nrs. 19.600

3 voetstap toiletten nrs. 450

Afvoerpijpen nrs.2.500

Sluitwerk en emmers nrs. 1.465

Lampen en bedrading nrs.2.810


Transportkosten nrs. 5.500

90 mandagen nrs. 38.500

Ingenieur & toezicht nrs. 7.000

Totaal NRS. 129.975 = € 1450

1 € = 90 nrs

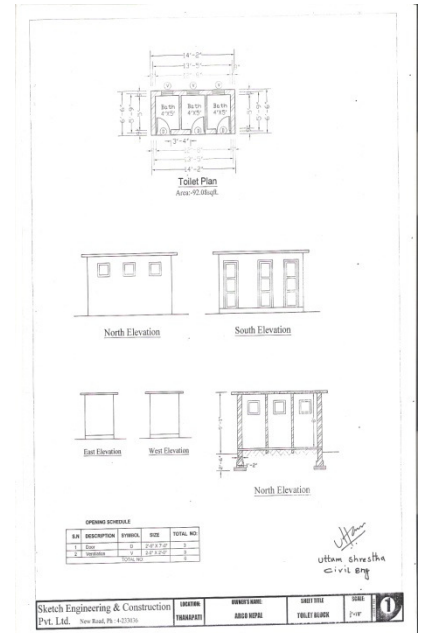

TOILET GROEP 2

Kosten:

2 voetstap toiletten & 2 urinoirs

Afvoer : septic tank

Bouwaanvraag nrs. 7.000

3500 bakstenen nrs.35.000

50 kilo betonijzer : nrs.3250

2 x deurkozijn + deur nrs.12.000

2 x raamkozijn nrs.2000

35 zakken cement nrs.24.500

2 voetstap toiletten nrs.300

Afvoerpijpen nrs.3000

Houten dakframe nrs.8.000

Zinken dakplaten nrs. 4.500

Sluitwerk emmers nrs.1.465

Lampen & bedrading nrs.3.000

Transportkosten nrs.6.500

90 mandagen nrs.38.500

Ingenieurs & toezicht nrs.7.000

Totaal NRS.156.015 =€ 1735,-

1 € = 90 nrs.

